

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ

LUXOR TECHNOLOGIES

Quản lý Rủi ro trong Đổi mới Công nghệ



THỰC HIỆN: NHÓM 14

Môn học: Quản lý Dự án cho Kỹ sư

Cơ quan: ĐHQG TP.HCM - Trường ĐH Bách Khoa

Nội dung Phân tích

- 1 Bối cảnh & Thách thức
- 2 Nhận diện Rủi ro
- 3 Chiến lược Ứng phó
- 4 Kết luận

■ Kỷ Nguyên Vàng (1992-1996)

- **Vị thế:** "Ngôi sao" ngành truyền thông không dây, mang lại lợi nhuận biên khổng lồ.
- **Mô hình:** *Tích hợp dọc (Vertical Integration)* - tự chủ sản xuất từ linh kiện đến thành phẩm để kiểm soát chất lượng tuyệt đối.
- **Tâm lý:** Ý lại vào vinh quang cũ, ngủ quên trên chiến thắng.

■ Khủng hoảng Bất ngờ (1996)

- **Đối thủ:** Nắm giữ bằng sáng chế công nghệ dải sóng đột phá mới hơn.
- **Nguy cơ:** Đánh mất vị thế Leader xuống làm Follower trong vòng ≤ 2 năm.
- **Ràng buộc:** Thời gian từ "yếu tố xa xỉ" trở thành "nút thắt sống còn".

Nhận diện Rủi ro: Mô hình Hệ quả (Consequential Risks)

Trước khi đi sâu vào chi tiết, cần xác định rõ chuỗi Nhân - Quả cơ bản dẫn đến sự sụp đổ của dự án:

Nguyên nhân gốc

Rủi ro kỹ thuật
Không sở hữu
bằng sáng chế mới,
mô hình tích hợp dọc lỗi thời.




Hệ quả

Rủi ro thị trường
Mất uy tín, sụt giảm thị phần,
từ vị thế Leader thành Follower.

Biểu đồ Ishikawa (Sơ đồ Xương Cá)

Phân rã tính các tác nhân vi mô cấu thành cuộc khủng hoảng của Luxor:

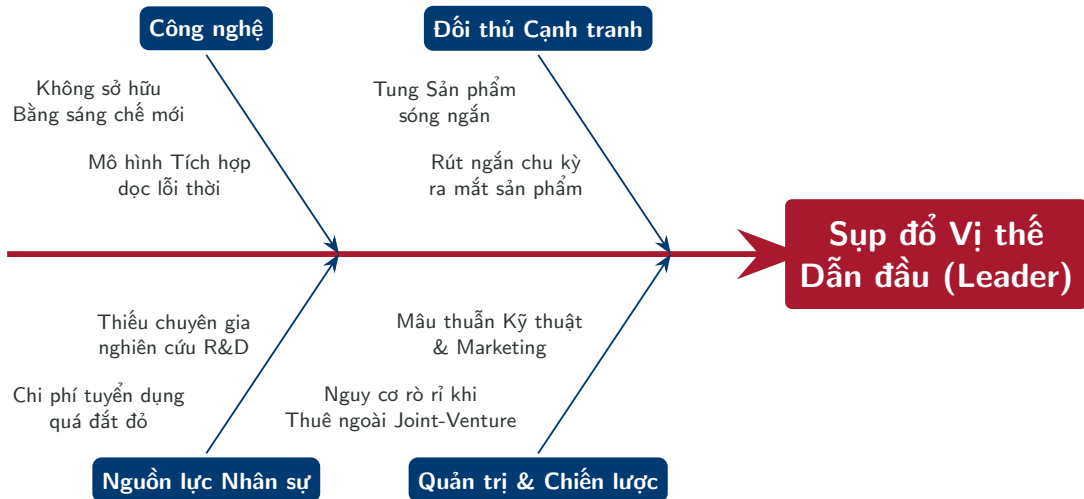

Đánh giá Định lượng Rủi ro (Heat-map Matrix)

Phép đo điểm chuẩn $Severity = Likelihood \times Impact \times Detection$. Dự án ưu tiên xử lý các nút thắt nằm ở **Vùng Đỏ (Trọng yếu)**:

Ma trận Phân tích (Likelihood $\times$ Impact)					
5		(2)			(5),(6)
4			(8)	(3)	
3					(4),(9)
2				(1)	(7)
1					
Khả năng	1	2	3	4	5

Phân tích Tiêu điểm:

- Vùng Đỏ (Cực đoan):** Phương án (5),(6) Outsourcing toàn phần → Nguy cơ "Dâng hiến" thông tin độc quyền nội bộ (Max Severity 100).
- Vùng Nguy hiểm:** Các chiến lược (3), (4) Liên doanh không chặt chẽ dẫn đến thoái vốn → Cạnh tranh sinh tồn.
- Vùng Vàng (Cảnh báo):** Khả năng chậm trễ R&D nội bộ do thiếu nhân tài.

Phân tích Chiến lược Ứng phó

1. Phân loại Phản ứng

Nhóm Chuyển dịch (Transferring)

Đẩy giao rủi ro cho đối tác:

- Thuê ngoài (Outsource).
- Mua/License công nghệ.
- Liên doanh/Sáp nhập.

Nhóm Giảm thiểu (Mitigating)

Hấp thụ và tự giải quyết rủi ro:

- Tuyển dụng chuyên gia R&D.
- Đào tạo lại nhân sự nội bộ.
- Tài trợ nghiên cứu trực tuyến.

2. Đánh giá Ưu & Nhược điểm

Tự chủ (Hệ Giảm thiểu)

Giữ bí mật công nghệ tuyệt đối nhưng tốn kém vĩ mô và đi lùi so với tốc độ thị trường.

Hợp tác (Hệ Chuyển dịch)

Giải cứu tốc độ (ra mắt sản phẩm kịp 1998) nhưng đánh mất bản sắc Tích hợp dọc và phụ thuộc ngoại lai.

Kiến nghị: Chiến lược Lai (Hybrid Roadmap)

Không một chiến thuật đơn lẻ nào thỏa mãn cả hàm [Thời gian] lẫn [Công nghệ]. Nhóm kiến nghị áp dụng **Chuỗi Liên Kết Lai (Hybrid-Phase)**:



Bài học Kinh nghiệm (Lessons Learned)

Vị thế của Người Quản lý (Project Manager)

PM không thể nghiêng về cái TÔI kỹ thuật, mà phải là "Bức tường dịch thuật" đứng giữa xung đột *Công nghệ* và *Khả năng sống còn Thương mại*.

Triết lý Đánh đổi (Trade-Off)

Không tồn tại chiếc cốc chúa thỏa mãn: "Nhanh nhất - Rẻ nhất - Tốt nhất". Quản trị rủi ro thực chất là nghệ thuật lựa chọn các **Sự hy sinh có tính toán** để giữ lại Sinh mệnh của Tổ chức.



THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

GROUP 14

PROJECT MANAGEMENT FOR ENGINEERS · HCMUT
